

MVS PROCONS SRL

CUI: 32745756 J12/306/2014; Str. Garii nr.5, ap.1; Cluj-Napoca; cod postal 400267
Tel: +40264.418.061; Fax: +40264.418.401
RO31BTRLRONCRT0435778001
Capital social: 200

**DISPOZITIE DE SANTIER
NR. 1**



**Conform contract nr. 5953 din 18.09.2023 Proiect : Asistență tehnică pentru
Obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în satul Răzoare, comuna
Miheșu de Câmpie, județul Mureș”**

Ca urmare a notei de constatare Nr.1 si a analizarii situatie din teren proiectantul dispune urmatoarele:

1. Suplimentarea cantitatii de balast in vederea corelarii listelor de cantitati din proiectul tehnic cu situatia existent din teren. Suplimentarea cantitatilor de balast se vor realiza pe toate obiectivele studiate in cadrul proiectului.
2. Pe strada Viilor se vor amenaja drumurile laterale de la km 0+080 (70 mp) si 0+230 (157.50 mp), partea dreapta.
3. Pe strada 22 Decembrie se vor amenaja drumurile laterale de la km 0+240 dreapta (70 mp), 0+310 stanga (7mp) si 0+420 stanga (82.50mp).
4. Pe strada 22 Decembrie se va reloca podetul tubular Ø600 (L=6.00m) de la km 0+150 la km 0+020.
5. Pe strada Mihai Voda se va amenaja drumul latela de la km 0+310 stanga (55mp).
6. Pe strada Mihai Voda se vor realiza coronamente din beton pentru podetul tubular existent Ø600 de la km 0+480.
7. Pe drumul comunal DC 107 se vor realiza coronamente din beton pentru podetul tubular Ø600 existent de la km 0+580.
8. Se va suplimenta cantitatea de indicatoare rutiere pentru DC 107 cu un numar de 36 bucati.
9. Pe drumul comunal DC 107 la km 3+165 se va amenaja intersectia cu strada Viilor si strada 22 Decembrie, amenajarea se va realiza pe o suprafata de 1133 mp.
10. Pe drumul comunal DC 107 se va inlocui podetul existent de la km 2+550 cu podet tubular Ø600, L=8 m. Nu sunt necesare cantitati suplimentare.

MVS PROCONS SRL

CUI: 32745756 J12/306/2014; Str. Garii nr.5, ap.1; Cluj-Napoca; cod postal 400267

Tel: +40264.418.061; Fax: +40264.418.401

RO31BTRLRONCRT0435778001

Capital social: 200

11. In urma executarii proiectului tehnic au rezultat o serie de cantitati de lucrari ramase la care se renunta. Lucrarile la cere se renunta sunt pe urmatoarele obiective:

1. STRADA VIILOR : 4.23 to strat BAD 22.4
2. Strada 22 Decembrie : 2.48 mp strat de asfalt BA16; 5.55 to strat BAD 22.4 ; si indicatoare rutiere 2 buc.
3. Strada Mihai Voda : 1.33 mp strat de asfalt BA 16 ; 9.88 to strat BAD 22.4 si Indicatoare rutiere 3 buc.
4. DC 107 – fundatie din blocaj 5mp si Indicatoare rutiere 1 buc.

Prezentei dispozitii de santier se vor anexa: Parti scrise: Nota de costatare nr. 1, Nota de comanda suplimentara (NCS) si Nota de renuntare (NR).

Parti desenate: Plan se situatie pag.01 – 06

BENEFICIAR, Comuna Miheșu de Câmpie	DIRIGINTE DE SANTIER Vancea Călin Ion
ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI S.C. MVS PROCONS S.R.L. ing. Oana Pădar 	EXECUTANT FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL Șef șantier: Pop Radu RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA Ing. Surd Andrei



FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

Cluj Napoca. Str. Donath, nr.120/A, Jud. Cluj

CUI:RO 33120968, Reg.Comerțului: J 12/1509/2014

Email: fgbiomaxconstruct@gmail.com

Tel: 0364 -801663

Obiectiv - Imbunatatirea infrastructurii rutiere a drumului legatura DC107 Mihesu de Campie - sat Razoare , Com.Mihesu de Campie , Jud. Mures

NOTA DE CONSTATARE NR.1

Avand in vedere derularea lucrarilor la obiectivul mai sus mentionat am constatat urmatoarele :

- *Pentru corelarea listelor de cantitati cu proiectul tehnic si cu situatia reala din teren din timpul executiei, se impune suplimentarea cantitatii stratului de balast . Mentionam faptul ca , cantitatea suplimentara de balast este necesara pt. a putea respecta stratificatia sistemului rutier , conform profilului transversal tip proiectat. Calculul cantitativ va fi efectuat cu respectarea profilului transversal tip si a detaliilor tehnice de executie iar decontarea se face la cantitati real executate. Aceasta corelare necesita a fi aplicata pe toate sectoarele de drum din proiectul tehnic Ca atare , solicitam proiectantului intocmirea dispozitiei de santier care sa cuprinda cele mentionate .*
- *Pe strada Viilor , la pozitiile km 0+080 partea dr. (70mp) si 0+230 partea dr. (157.5mp) au fost identificate doua drumuri laterale care necesita a fi amenajate*
- *Pe Strada 22 decembrie , la poz. Km 0+240 partea dr. (70mp), 0+310 partea stg. (70mp)si 0+420 partea stg. 82.5mp) au fost idenntificate 3 drumuri laterale , care necesita a fi amenajate .*
- *Pe strada 22 decembrie , datorita configuratiei terenului si pt a facilita scurgerea apelor , se propune relocarea podetului tubular $\varnothing 600$, L= 6m , de la poz. Km 0+150 , la pozitia km 0+020.*
- *Pe strada Mihai Voda , la poz. Km 0+310 partea stg. (55mp), a fost identificat un dr, lateral care necesita a fi amenajat.*

- Pe strada Mihai Voda , la podetul tubular existent Ø600, de la poz. Km 0+480 , este necesar a se executa coronamente din beton
- Pe drumul comunal DC 107, la podetul tubular existent Ø600, de la poz. Km 0+580 , este necesar a se executa coronamente din beton
- Pe drumul comunal DC 107 , pentru corelarea listelor de cantitati cu proiectul tehnic , este necesara suplimentarea cantitatii de indicatoare rutiere , cu 36 buc.
- Pe drumul comunal DC 107, la poz. Km 3+165 , pentru a facilita accesul in centru de localitate se propune amenajarea intersectie cu str. VIIOR si strada 22 DECEMBRIE . Suprafata care necesita a fi modernizate este in cuantum de 1133mp . Mentionam ca sistemul rutier pt aceasta suprafata necesita doar strat de baza din piatra sparta si cele doua straturi de asfalt. Pentru stratul de fundatie din balast se poate lua in calcul zestrea existenta a drumului , care a fost confirmata prin efectuarea de sondaje in situ .
- Pe drumul comunal DC 107 , la pozitia km 2+550 a fost identificat podetul tubular transversal existen , in stare avansata de degradare . Mentionam ca acesta nu poate fi pastrat si a necesitat a fi inlocuit cu un podet tubular nou Ø600 , L=8ml . Mentionam ca pentru acest podet tubular nu sunt necesare cantitati suplimentare , acestea regasindu-se in lista de cantitati.

In urma celor constatate , rugam proiectantul lucrarii sa emita dispozitia de santier , care sa cuprinda modificarile solicitate.

R.T.E. – SURD ANDREI


SEF SANTIER – POP RADU

DIRIGINTE DE SANTIER

BENEFICIAR



ROMÂNIA - M.D.H.T. - I.S.C.
VANCEA CĂLIN ION
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00021149/00031500
 DOMENII/SUBDOMENII:
 1;2.4;3.2;5.3;6;7/1;8.2



17.12.2024

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures

OBIECTUL: Strada Viilor

STADIUL FIZIC: Fundatii din balast


Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)

Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	25.37				
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	5.89				
1.2	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 (0-63) mm	mc	33.26				
1.3	12811	Pavator categoria I	ora	6.60				
1.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	2.79				
1.5	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	1.22				
1.7	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	3.88				
1.9	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.58				
2	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	56.54				
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
2.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	56.54				
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:								
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Total Inclusiv Cheltuieli directe:								
Cheltuieli indirecte								
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:								
Profit								
Total Inclusiv Beneficiu:								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								
TVA:								
TOTAL GENERAL:								
Ofertant,								



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Viilor
STADIUL FIZIC: Strat de piatra sparta
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	68.25					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
1.1	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 (0-8) mm	mc	17.54					
1.2	2201658 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	6.96					
1.3	2201672 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	86.68					
1.4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	17.06					
1.5	12811 Pavator categoria I	ora	40.95					
1.6	12821 Pavator categoria a II-a	ora	13.65					
1.7	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	2.87					
1.8	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	17.61					
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	1.71					
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	161.31					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	161.31					
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:								
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Total Inclusiv Cheltuieli directe:								
Cheltuieli indirecte								
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:								
Profit								
Total Inclusiv Beneficiu:								



PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

--	--	--	--	--	--



Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Viilor
STADIUL FIZIC: Strat de legatura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01B1	mp	227.50		
	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;				
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806	mc	1.14		
	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne				
1.2	4026	ora	0.14		
	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp				
1.3	5603	ora	0.11		
	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire				
2	DB02B1	100 mp	2.28		
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;				
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10828	tona	0.32		
	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing				
2.2	6202806	mc	0.08		
	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne				
2.3	10111	ora	4.55		
	Asfaltator categoria I				
2.L	20018304	tona	0.32		
	Bitum pentru drumuri lichid nii 1447				
3	TRA05A80	tona	0.32		
	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80				
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA05A80	tona	0.32		
	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80				
4	DB14B1	tona	32.07		
	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;				
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10803	tona	32.17		
	Lista: Mixturi, mortare asfaltice				
4.2	3421358	kg	3.69		
	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36				
4.3	10111	ora	4.17		
	Asfaltator categoria I				
4.4	10121	ora	2.89		
	Asfaltator categoria a II-a				
4.5	10131	ora	4.81		
	Asfaltator categoria a III-a				
4.6	10151	ora	1.28		
	Asfaltator categoria a V-a				
4.7	4005	ora	1.41		
	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf				
4.8	4008	ora	1.41		
	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf				
4.9	4046	ora	1.41		
	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp				

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de legatura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20 (BAD22.4)	tona	32.17	
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	32.17	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	32.17	
		procent	material	manopera	utilaj
		transport	total		
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Viilor
STADIUL FIZIC: Strat de uzura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	227.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.68	
1.2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.07	
1.3	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.07	
2	DB02A1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	2.28	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10828	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.23	
2.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.06	
2.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	4.55	
2.L	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.23	
3	TRA05A80	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.23	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA05A80	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.23	
4	DB20E1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	227.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	21.84	
4.2	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 (0-4) mm	mc	0.46	
4.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	5.69	
4.4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	4.78	
4.5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	6.83	
4.6	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	3.64	
4.7	12811	Pavator categoria I	ora	0.23	
4.8	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.23	
4.9	4045	Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65CP	ora	3.66	

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de uzura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	21.84			
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	21.84			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	21.84			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,



Raport generat cu ISDP , www.deveze.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada 22 Decembrie
STADIUL FIZIC: Fundatii din balast
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	86.31		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	20.02		
1.2	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 (0-63) mm	mc	113.15		
1.3	12811 Pavator categoria I	ora	22.44		
1.4	12821 Pavator categoria a II-a	ora	9.49		
1.5	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	4.14		
1.7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	13.21		
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	1.99		
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	192.36		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	192.36		
			procent		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
			total		
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inklusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
Ofertant,					



Raport generat cu ISDP , www.dezive.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada 22 Decembrie
STADIUL FIZIC: Strat de piatra sparta
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	47.85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 (0-8) mm	mc	12.30		
1.2	2201658 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	4.88		
1.3	2201672 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	60.77		
1.4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	11.96		
1.5	12811 Pavator categoria I	ora	28.71		
1.6	12821 Pavator categoria a II-a	ora	9.57		
1.7	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	2.01		
1.8	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	12.35		
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	1.20		
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	113.09		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	113.09		
			procent		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
			total		
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada 22 Decembrie
STADIUL FIZIC: Strat de legatura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	159.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.80		
1.2	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.10		
1.3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.08		
2	DB02B1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	1.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10828 Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.22		
2.2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.06		
2.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	3.19		
2.L	20018304 Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.22		
3	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.22		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.22		
4	DB14B1 Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	22.49		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10803 Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	22.56		
4.2	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	2.59		
4.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	2.92		
4.4	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	2.02		
4.5	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	3.37		
4.6	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	0.90		
4.7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	0.99		
4.8	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16ff	ora	0.99		
4.9	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	0.99		

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de legatura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
4.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20 (BAD22.4)	tona	22.56			
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	22.56			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	22.56			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Ofertant,



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada 22 Decembrie
STADIUL FIZIC: Strat de uzura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	159.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.48		
1.2	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.05		
1.3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.05		
2	DB02A1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	1.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10828 Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.16		
2.2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.04		
2.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	3.19		
2.L	20018304 Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.16		
3	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.16		
4	DB20E1 Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	159.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10803 Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	15.31		
4.2	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 (0-4) mm	mc	0.32		
4.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	3.99		
4.4	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	3.35		
4.5	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	4.79		
4.6	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	2.55		
4.7	12811 Pavator categoria I	ora	0.16		
4.8	12821 Pavator categoria a II-a	ora	0.16		
4.9	4045 Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65CP	ora	2.57		

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de uzura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	15.31	
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	15.32	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	15.32	
		procent	material	manopera	utilaj
		transport	total		
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Mihai Voda
STADIUL FIZIC: Fundatii din balast
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	161.06		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	37.37		
1.2	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 (0-63) mm	mc	211.15		
1.3	12811 Pavator categoria I	ora	41.88		
1.4	12821 Pavator categoria a II-a	ora	17.72		
1.5	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	7.73		
1.7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	24.64		
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	3.70		
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	358.95		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	358.95		
			procent		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
			total		
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Mihai Voda
STADIUL FIZIC: Strat de piatra sparta
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	16.15		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 (0-8) mm	mc	4.15		
1.2	2201658 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	1.65		
1.3	2201672 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	20.51		
1.4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	4.04		
1.5	12811 Pavator categoria I	ora	9.69		
1.6	12821 Pavator categoria a II-a	ora	3.23		
1.7	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	0.68		
1.8	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	4.17		
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.40		
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	38.17		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	38.17		
			procent		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
			total		
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					



PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Mihai Voda
STADIUL FIZIC: Strat de legatura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	55.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.28	
1.2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.03	
1.3	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.03	
2	DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruii macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	0.55	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10828	Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.08	
2.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.02	
2.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	1.10	
2.L	20018304	Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.08	
3	TRA05A80	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA05A80	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.08	
4	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	7.76	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10803	Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	7.78	
4.2	3421358	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	0.89	
4.3	10111	Asfaltator categoria I	ora	1.01	
4.4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0.70	
4.5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	1.16	
4.6	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	0.31	
4.7	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	0.34	
4.8	4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	ora	0.34	
4.9	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	0.34	

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de legatura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20 (BAD22.4)	tona	7.78	
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	7.78	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	7.78	
		procent	material	manopera	utilaj
		transport	total		
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,



Raport generat cu ISDP , www.dezive.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Mihai Voda
STADIUL FIZIC: Strat de uzura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	55.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.17		
1.2	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.02		
1.3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.02		
2	DB02A1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	0.55		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10828 Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.06		
2.2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.01		
2.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	1.10		
2.L	20018304 Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.06		
3	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.06		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.06		
4	DB20E1 Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare mecanica	mp	55.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10803 Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	5.28		
4.2	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 (0-4) mm	mc	0.11		
4.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	1.38		
4.4	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	1.16		
4.5	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	1.65		
4.6	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	0.88		
4.7	12811 Pavator categoria I	ora	0.06		
4.8	12821 Pavator categoria a II-a	ora	0.06		
4.9	4045 Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65CP	ora	0.89		

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de uzura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	5.28	
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	5.28	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	5.28	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Mihai Voda
STADIUL FIZIC: Podet existent
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprj. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	17.23		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.03		
1.2	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.01		
1.3	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.02		
1.4	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	1.03		
1.5	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	1.22		
1.6	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.72		
1.7	7315789 Decofrol	kg	2.58		
1.8	10711 Dulgher constructii categoria I	ora	3.91		
1.9	10721 Dulgher constructii categoria a II-a	ora	4.54		
1.10	10731 Dulgher constructii categoria a III-a	ora	5.97		
1.11	10741 Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	1.98		
2	PB09A1 Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...manual	mc	2.62		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10173 Lista: Beton preparate	mc	2.64		
2.2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.26		
2.3	10221 Betonist categoria a II-a	ora	1.57		
2.4	10231 Betonist categoria a III-a	ora	1.57		
2.5	19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3.02		
2.6	19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0.19		
2.7	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	ora	1.27		
2.L	2100995 Beton de ciment C30/37	mc	2.64		
3	TRA06A80 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	6.34		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA06A80 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	6.34		

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada 9 Mai
STADIUL FIZIC: Fundatii din balast
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	39.97				
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	9.27				
1.2	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 (0-63) mm	mc	52.40				
1.3	12811	Pavator categoria I	ora	10.39				
1.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	4.40				
1.5	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	1.92				
1.7	4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	ora	6.12				
1.9	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.92				
2	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	89.08				
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
2.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	89.08				
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:								
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Total Inclusiv Cheltuieli directe:								
Cheltuieli indirecte								
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:								
Profit								
Total Inclusiv Beneficiu:								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								
TVA:								
TOTAL GENERAL:								
Ofertant,								



OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT
STADIUL FIZIC: Strat de piatra sparta
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	339.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 (0-8) mm	mc	87.35		
1.2	2201658 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	34.67		
1.3	2201672 Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	431.67		
1.4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	84.98		
1.5	12811 Pavator categoria I	ora	203.94		
1.6	12821 Pavator categoria a II-a	ora	67.98		
1.7	3546 Autogreder pina la 175cp	ora	14.28		
1.8	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	87.69		
1.9	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	8.50		
2	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	803.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	803.35		
			procent		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
			total		
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					



PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT
STADIUL FIZIC: Strat de legatura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1,133.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	5.67		
1.2	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.68		
1.3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.57		
2	DB02B1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	11.33		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10828 Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	1.59		
2.2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.42		
2.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	22.66		
2.L	20018304 Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	1.59		
3	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	1.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	1.58		
4	DB14B1 Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	159.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10803 Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	160.23		
4.2	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	18.37		
4.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	20.77		
4.4	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	14.38		
4.5	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	23.96		
4.6	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	6.39		
4.7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	7.03		
4.8	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	ora	7.03		
4.9	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	7.03		

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de legatura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
4.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20 (BAD22.4)	tona	160.23			
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	160.23			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	160.23			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							



Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT
STADIUL FIZIC: Strat de uzura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1,133.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806 Apa industrialia pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3.40		
1.2	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.34		
1.3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.34		
2	DB02A1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	11.33		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10828 Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	1.13		
2.2	6202806 Apa industrialia pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.29		
2.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	22.66		
2.L	20018304 Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	1.13		
3	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	1.13		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	1.13		
4	DB20E1 Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare mecanica	mp	1,133.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10803 Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	108.77		
4.2	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 (0-4) mm	mc	2.27		
4.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	28.33		
4.4	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	23.79		
4.5	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	33.99		
4.6	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	18.13		
4.7	12811 Pavator categoria I	ora	1.13		
4.8	12821 Pavator categoria a II-a	ora	1.13		
4.9	4045 Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65CP	ora	18.24		

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Strat de uzura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	108.77	
5	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	108.77	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	108.77	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT
STADIUL FIZIC: Podet existent
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	11.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.02		
1.2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.00		
1.3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.01		
1.4	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0.69		
1.5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	0.82		
1.6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.48		
1.7	7315789	Decofrol	kg	1.73		
1.8	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	2.61		
1.9	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	3.03		
1.10	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	3.98		
1.11	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	1.32		
2	PB09A1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...manual	mc	1.74		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1.75		
2.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.17		
2.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	1.04		
2.4	10231	Betonist categoria a III-a	ora	1.04		
2.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.00		
2.6	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0.13		
2.7	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	ora	0.84		
2.L	2100995	Beton de ciment C30/37	mc	1.75		
3	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	4.21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	4.21		

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

STADIUL FIZIC: Podet existent

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	PB09B1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...pompa	mc	1.58	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1.59	
4.2	10211	Betonist categoria I	ora	0.10	
4.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.10	
4.4	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.18	
4.5	10241	Betonist categoria a IV-a	ora	0.08	
4.6	10251	Betonist categoria a V-a	ora	0.10	
4.7	3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	0.10	
4.8	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	ora	0.76	
4.L	2100969	Beton de ciment C16/20	mc	1.59	
5	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	3.81	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.1	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	3.81	
		procent	material	manopera	utilaj
		transport	total		
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
	Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: NCS - Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT
STADIUL FIZIC: Marcaje si indicatoare rutiere
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4		
1	DF18A1	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	27.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
1.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	2.70				
1.2	10826	Lista: Stîlp metalici ptr indicatoare	buc	27.00				
1.3	10211	Betonist categoria I	ora	2.16				
1.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	6.75				
1.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	20.49				
1.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	2.70				
1.L	6301793	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	27.00				
2	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	6.48				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
2.1	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	6.48				
3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	36.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
3.1	10821	Lista: Indicatoare de circulatie	buc	36.00				
3.2	5800376	Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	144.00				
3.3	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	72.00				
3.4	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	144.00				
3.5	5840766	Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	72.00				
3.6	5882142	Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0.72				
3.7	5882489	Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	1.44				
3.8	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	ora	7.92				
3.9	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	7.92				
3.L	7101358	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f73 s1848	buc	36.00				
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:								

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Viilor
STADIUL FIZIC: Strat de legatura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3nr - Note de Renuntare

lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	DB14B1 Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	4.22		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10803 Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	4.23		
4.2	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	0.48		
4.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	0.55		
4.4	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	0.38		
4.5	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	0.63		
4.6	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	0.17		
4.7	4005 Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	0.19		
4.8	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	ora	0.19		
4.9	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	0.19		
4.L	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD20 (BAD22.4)	tona	4.23		
5	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	4.23		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	TRA01A80 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	4.23		
			procent		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
			total		
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					



PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada 22 Decembrie
STADIUL FIZIC: Strat de legatura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	2.48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.01		
1.2	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.00		
1.3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.00		
2	DB02B1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	0.02		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10828 Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.00		
2.2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.00		
2.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	0.04		
2.L	20018304 Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.00		
3	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.00		
4	DB14B1 Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	5.53		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10803 Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	5.55		
4.2	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	0.64		
4.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	0.72		
4.4	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	0.50		
4.5	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	0.83		
4.6	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	0.22		
4.7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	0.24		
4.8	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	ora	0.24		
4.9	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	0.24		

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada 22 Decembrie
STADIUL FIZIC: Strat de uzura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3nr - Note de Renuntare

lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2.48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.01		
1.2	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.00		
1.3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.00		
2	DB02A1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	0.02		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10828 Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.00		
2.2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.00		
2.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	0.04		
2.L	20018304 Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.00		
3	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.00		
4	DB20E1 Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare mecanica	mp	2.48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10803 Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	0.24		
4.2	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 (0-4) mm	mc	0.00		
4.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	0.06		
4.4	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	0.05		
4.5	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	0.07		
4.6	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	0.04		
4.7	12811 Pavator categoria I	ora	0.00		
4.8	12821 Pavator categoria a II-a	ora	0.00		
4.9	4045 Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65CP	ora	0.04		

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada 22 Decembrie
STADIUL FIZIC: Marcaje si indicatoare rutiere
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
2	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	0.20			
2.2	10826	Lista: Stilp metalici ptr indicatoare	buc	2.00			
2.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.16			
2.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.50			
2.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.52			
2.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	0.20			
2.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2.00			
3	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	0.48			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3.1	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	0.48			
4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4.1	10821	Lista: Indicatoare de circulatie	buc	2.00			
4.2	5800376	Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	8.00			
4.3	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	4.00			
4.4	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	8.00			
4.5	5840766	Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	4.00			
4.6	5882142	Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0.04			
4.7	5882489	Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0.08			
4.8	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	ora	0.44			
4.9	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0.44			
4.L	7101358	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f73 s1848	buc	2.00			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

F3nr - Note de Renuntare

lei -

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
--	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte					
----------------------	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit					
--------	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Beneficiu:**TOTAL GENERAL (fara TVA):****TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Mihai Voda
STADIUL FIZIC: Strat de legatura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1.33		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.01		
1.2	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.00		
1.3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.00		
2	DB02B1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp	0.01		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10828 Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.00		
2.2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.00		
2.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	0.03		
2.L	20018304 Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.00		
3	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.00		
4	DB14B1 Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	9.85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10803 Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	9.88		
4.2	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	1.13		
4.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	1.28		
4.4	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	0.89		
4.5	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	1.48		
4.6	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	0.39		
4.7	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	0.43		
4.8	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	ora	0.43		
4.9	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	ora	0.43		

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Mihai Voda
STADIUL FIZIC: Strat de uzura
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1.33		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.00		
1.2	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	ora	0.00		
1.3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.00		
2	DB02A1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100 mp	0.01		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	10828 Lista: Solutii bituminoase inclusiv dressing	tona	0.00		
2.2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.00		
2.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	0.03		
2.L	20018304 Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	tona	0.00		
3	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	TRA05A80 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 80	tona	0.00		
4	DB20E1 Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternare mecanica	mp	1.33		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	10803 Lista: Mixturi, mortare asfaltice	tona	0.13		
4.2	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 (0-4) mm	mc	0.00		
4.3	10111 Asfaltator categoria I	ora	0.03		
4.4	10121 Asfaltator categoria a II-a	ora	0.03		
4.5	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	0.04		
4.6	10151 Asfaltator categoria a V-a	ora	0.02		
4.7	12811 Pavator categoria I	ora	0.00		
4.8	12821 Pavator categoria a II-a	ora	0.00		
4.9	4045 Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65CP	ora	0.02		

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Strada Mihai Voda
STADIUL FIZIC: Marcaje si indicatoare rutiere
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4		
2	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	3.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
2.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	0.30				
2.2	10826	Lista: Stilp metalici ptr indicatoare	buc	3.00				
2.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.24				
2.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.75				
2.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.28				
2.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	0.30				
2.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	3.00				
3	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	0.72				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
3.1	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	0.72				
4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	3.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
4.1	10821	Lista: Indicatoare de circulatie	buc	3.00				
4.2	5800376	Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	12.00				
4.3	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	6.00				
4.4	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	12.00				
4.5	5840766	Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	6.00				
4.6	5882142	Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0.06				
4.7	5882489	Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0.12				
4.8	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	ora	0.66				
4.9	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0.66				
4.L	7101358	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f73 s1848	buc	3.00				
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:								

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

F3nr - Note de Renuntare

lei -

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Alte cheltuieli directe:Contributie asiguratorie
pentru munca (CAM)**Total Inclusiv Cheltuieli directe:**

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:**TOTAL GENERAL (fara TVA):****TVA:****TOTAL GENERAL:**

Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.dezive.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures

OBIECTUL: Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT

STADIUL FIZIC: Strat din blocaj piatra

Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)

Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA16A1	Fundatie din blocaj de piatra bruta sau bolovani de rau de 14-18 cm, acoperita, pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast sau nisip de 5 cm grosime dupa compactare, executata din : piatra bruta cu substrat de balast:	mp	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	mc	0.32	
1.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 (0-8) mm	mc	0.09	
1.3	2201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 cm.	mc	0.87	
1.4	2201658	Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	0.05	
1.5	2201672	Piatra sparta amestec optimal 0-63mm	mc	0.64	
1.6	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.10	
1.7	12811	Pavator categoria I	ora	1.70	
1.8	12821	Pavator categoria a II-a	ora	1.70	
1.9	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	0.02	
1.10	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.01	
2	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	2.42	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	TRA01A80	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	tona	2.42	
			procent		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
			total		
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

OBIECTIV: Imbunatatirea infrastructurii rutiere in sat Razoare, Comuna Mihesu de Campie, judetul Mures
OBIECTUL: Drum comunal DC 107 - REST DE EXECUTAT
STADIUL FIZIC: Marcaje si indicatoare rutiere
Beneficiar: COMUNA MIHESU DE CIMPIE (PRIMARIA MIHESU DE CIMPIE)
Executant: FQ BIOMAX CONSTRUCT SRL

F3nr - Note de Renuntare

- lei -




SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	0.10		
2.2	10826	Lista: Stilp metalici ptr indicatoare	buc	1.00		
2.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.08		
2.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.25		
2.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.76		
2.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	0.10		
2.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.00		
3	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	0.24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	TRA06A80	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=80 km	tona	0.24		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
		Cheltuieli indirecte				
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
		Profit				
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,




Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

PRETURILE MATERIALELOR (PENTRU CARE NU EXISTA ARTICOL DE TIP TRA SEPARAT) SUNT CU TRANSPORT INCLUS PANA LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA.

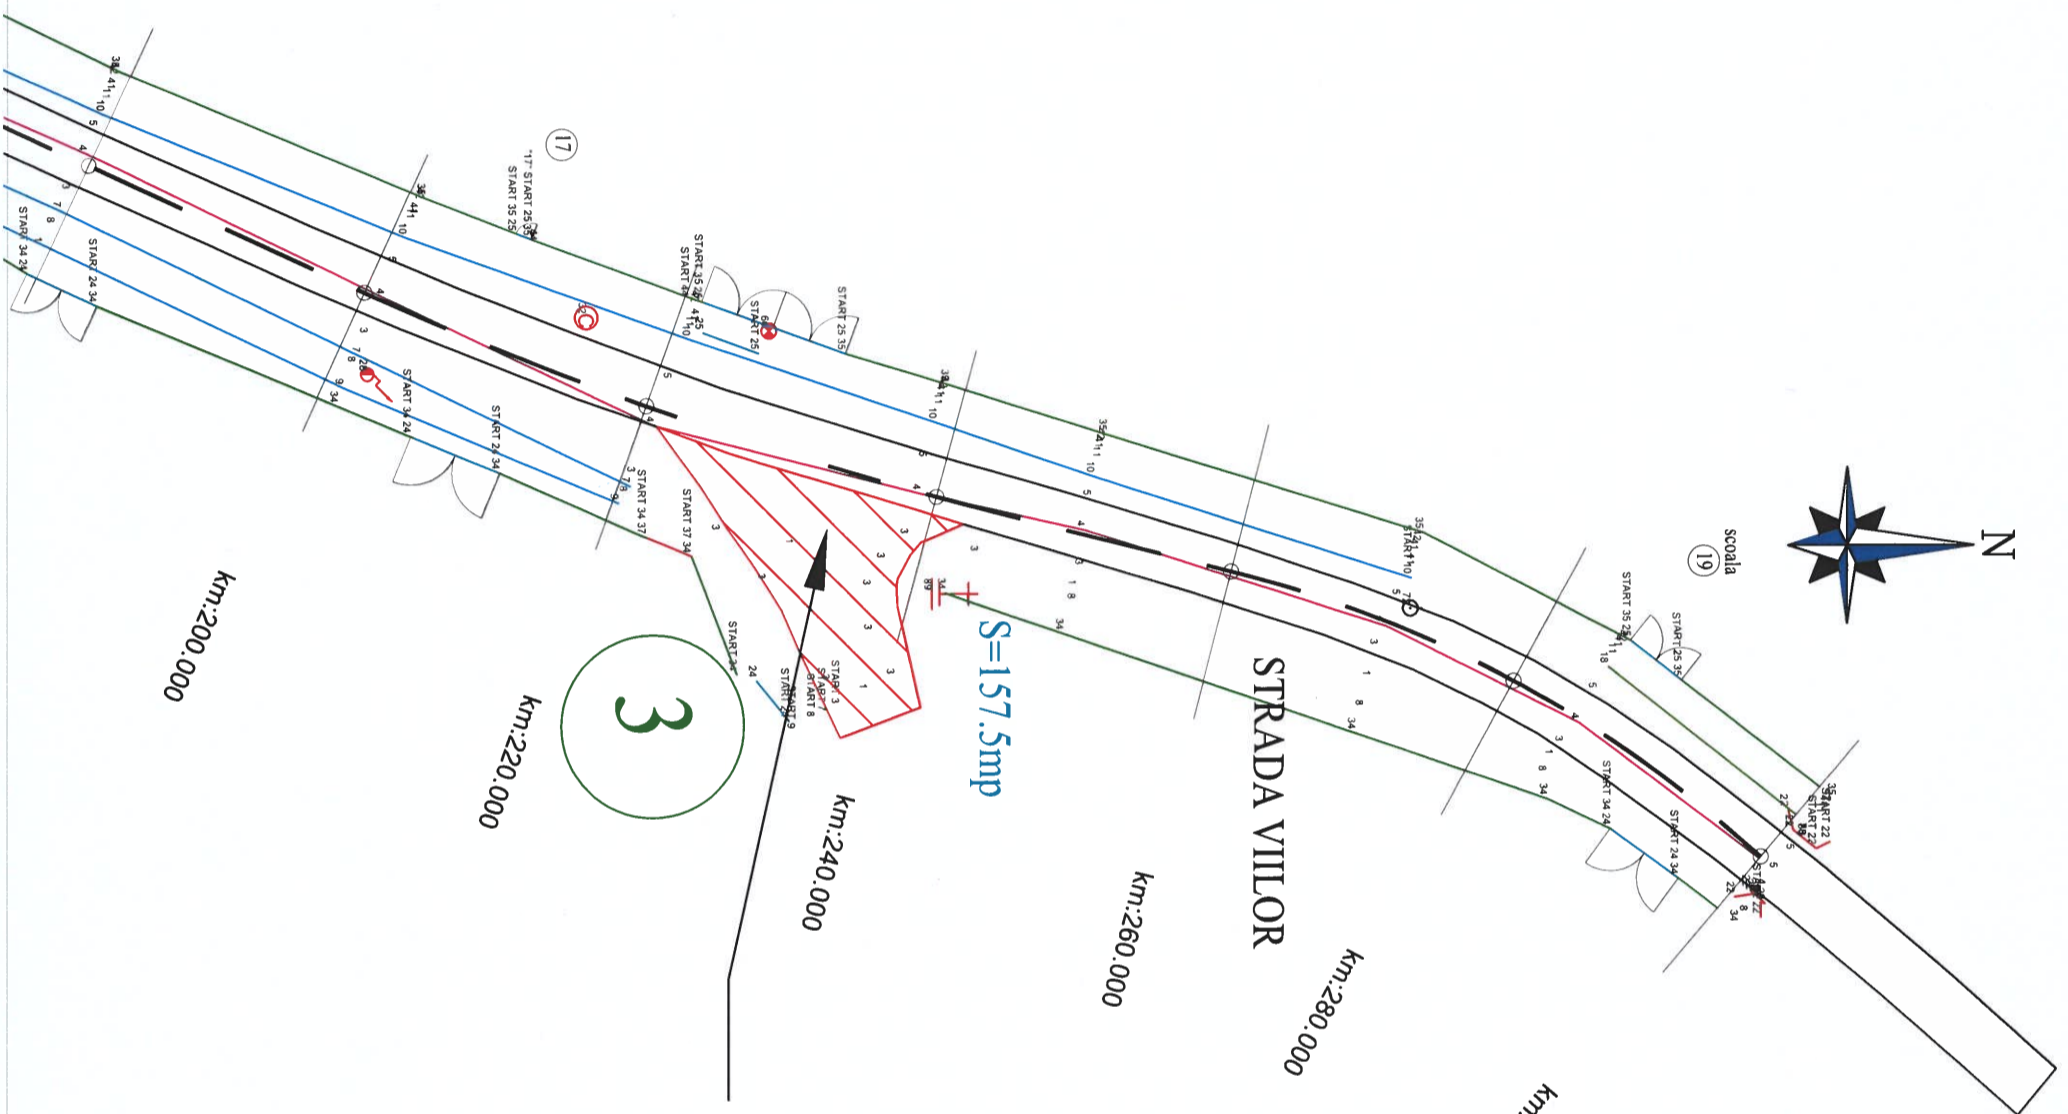

**Strada Viilor - km 0+230
suprafata - 157.50 mp**

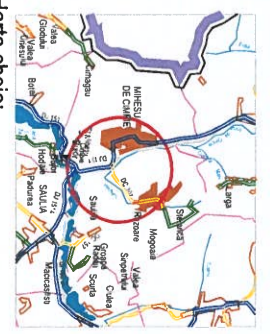

Harta cheie:
BENEFICIAR

Mihesu de Câmpie

DENUMIREA CONTRACTULUI
Asistenta tehnica

pentru realizarea obiectivului de investitii:
"Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Sat Razoare, comuna Mihesu de Campie
jud. Mures"

Contract nr.:
5953/18.09.2023
DENUMIREA PROIECTULUI

"Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Sat Razoare, comuna Mihesu de Campie
jud. Mures"

Proiect nr.:
AT/2024

Proiectant general:
S.C. MVS PROCONS S.R.L.

MVS PROCONS

Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decât cu acordul scris al S.C. MVS PROCONS S.R.L.
Nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate

Data: 2024	Seif proiect
Proiectant: Ing. Oana Podar	ing. Vlad Morar
Destinat: Ing. Oana Podar	Manager proiect
VERIFICATOR TEHNIC	ing. Vlad Morar
DATA	DATA


STR. VIILOR

PLAN DE SITUATIE

Scara: 1:500

Faza: Asistenta tehnica

Cod: AT/2024-SR-01- PS-03

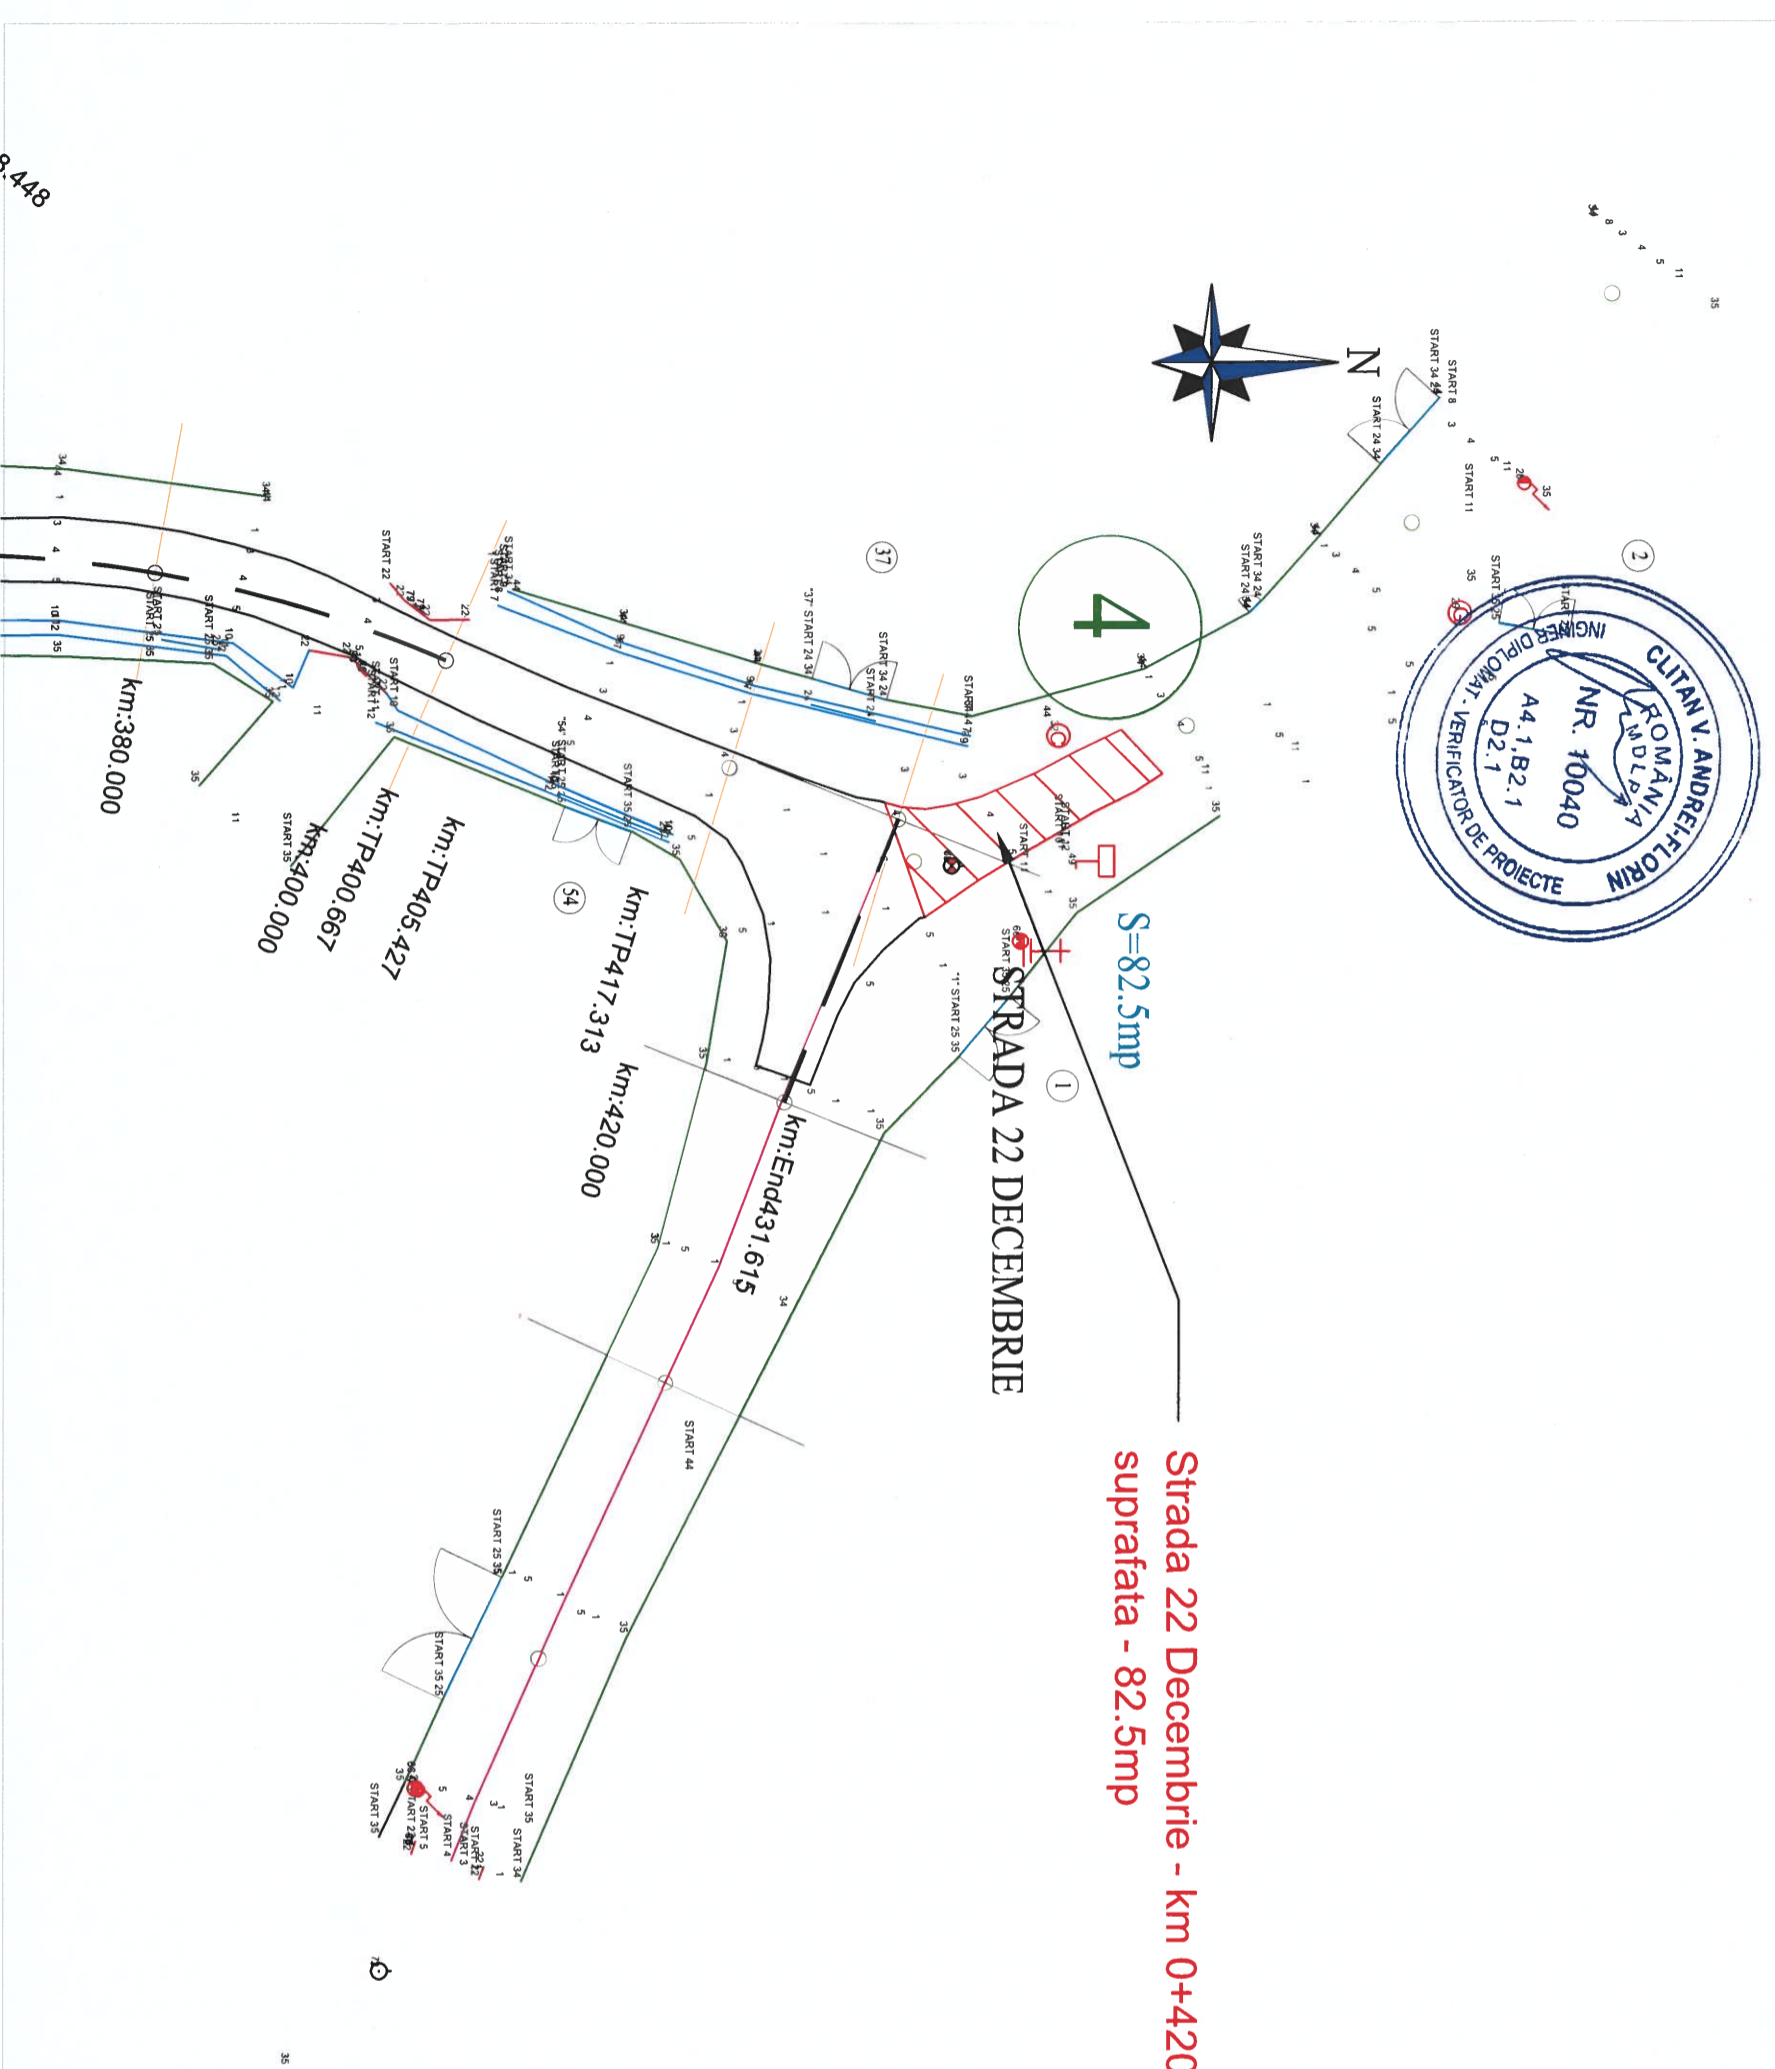

**Strada 22 Decembrie - km 0+420
suprafata - 82.5mp**



Harta cheie:

BENEFICIAR

Mihesu de Câmpie

DENUMIREA CONTRACTULUI
Asistenta tehnica

pentru realizarea obiectivului de investitii:
"Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Sat Razoare, comuna Mihesu de Câmpie
jud.Mures"

Contract nr.:
5953/18.09.2023

DENUMIREA PROIECTULUI
"Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Sat Razoare, comuna Mihesu de Câmpie
jud.Mures"

Proiect nr.:
AT/2024

Proiectant general:
S.C. MVS PROCONS S.R.L.

MVS PROCONS
Acest proiect si informatiile cuprinse in el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decât cu acordul scris al S.C. MVS PROCONS S.R.L.
Nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate



Proiectat	Ing. Oana Podar	Self proiect	Ing. Vlad Morar
Desenat	Ing. Oana Podar	Manager proiect	Ing. Vlad Morar
VERIFICATOR TEHNIC			
Data			



str. 22 Decembrie

PLAN DE SITUATIE

Scara: 1:500

Faza: Asistenta tehnica

Cod: AT/2024-SR-01- PS-04

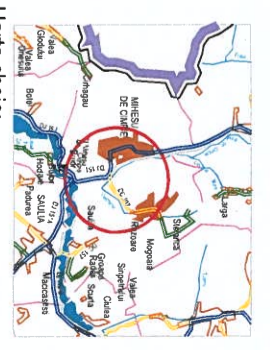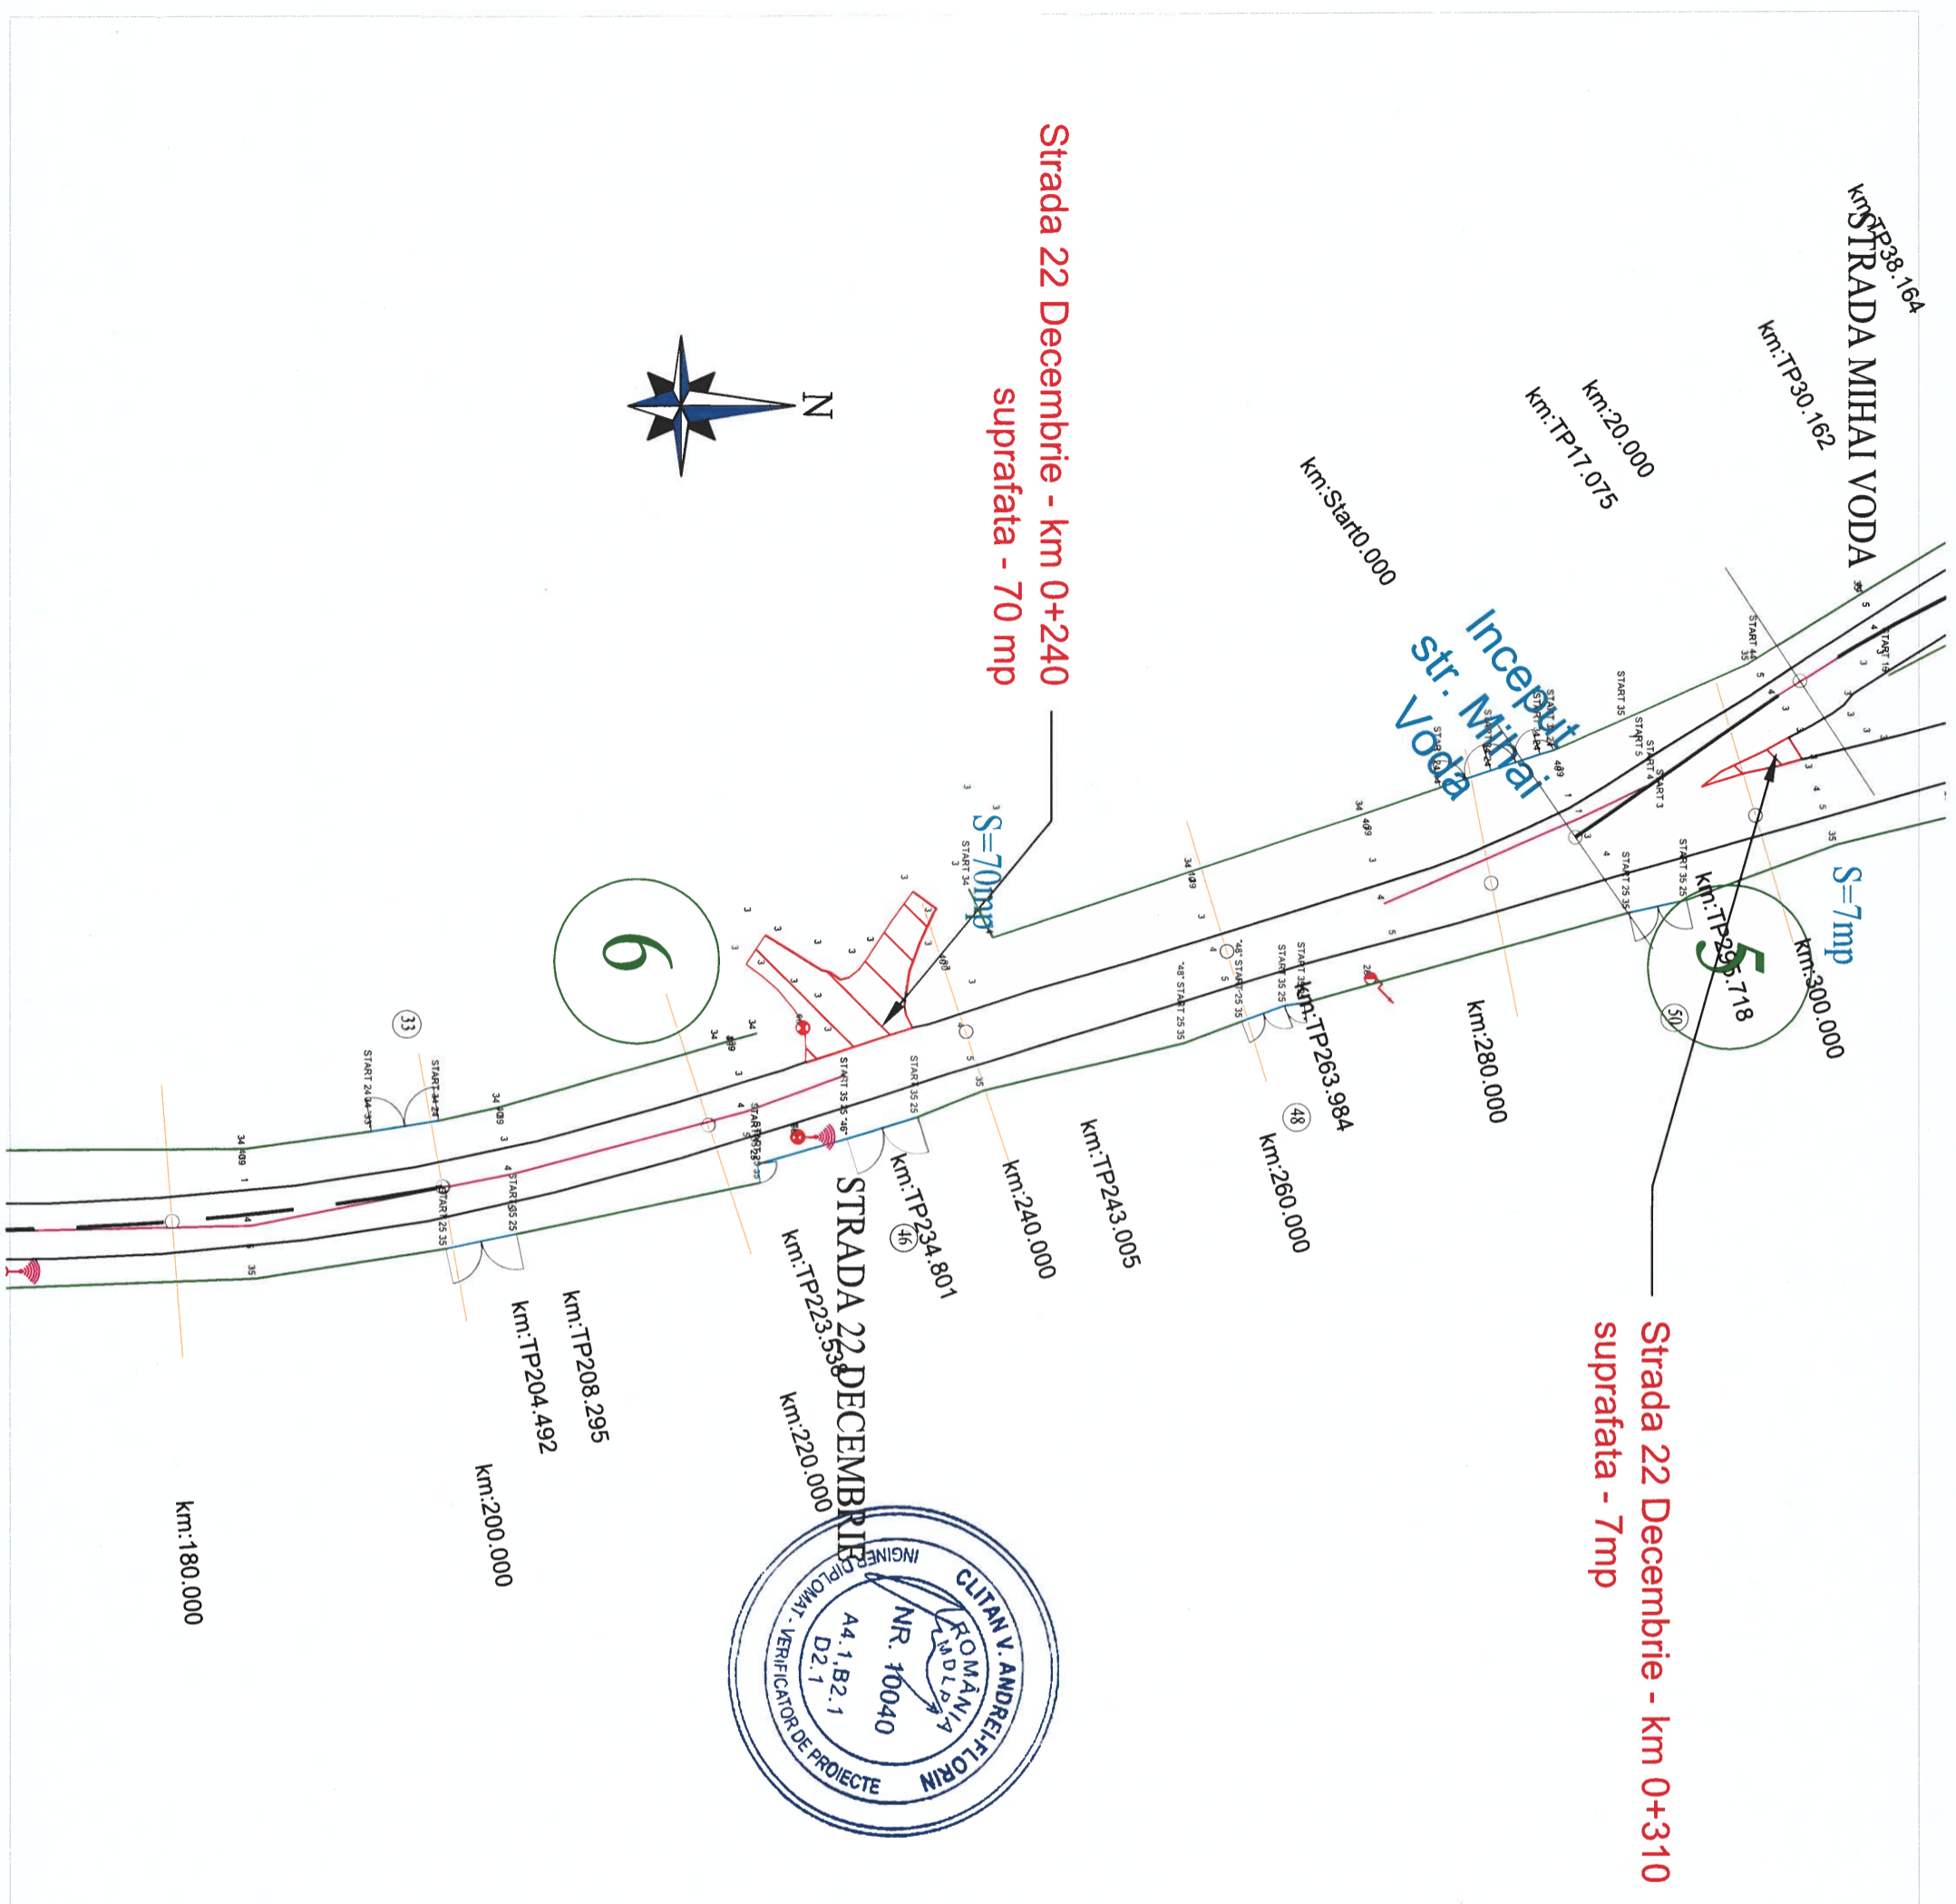

Harta cheie:

BENEFICIAR

Minesu de Câmpie

DENUMIREA CONTRACTULUI
Asistenta tehnica
 pentru realizarea obiectivului de investitii:

"Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
 Sat Razoare, comuna Minesu de Campie
 Jud. Mures"

Contract nr.:
5953/18.09.2023
 DENUMIREA PROIECTULUI

"Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
 Sat Razoare, comuna Minesu de Campie
 Jud. Mures"

Proiect nr.:
AT/2024

Proiectant general:
S.C. MVS PROCONS S.R.L.

MVS PROCONS
 Acest proiect și informațiile conținute în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau parțial, decât cu acordul scris al S.C. MVS PROCONS S.R.L.
 Numar / / folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.

Data: 2024	Seif proiect
Proiectat: Ing. Oana Podar	Ing. Vlad Morar
Desenat: Ing. Oana Podar	Manager proiect: Ing. Vlad Morar
VERIFICATOR TEHNIC	Data


str. 22 Decembrie

PLAN DE SITUATIE


Scara: 1:500

Faza: Asistenta tehnica

Cod: AT/2024-SR-01- PS-05

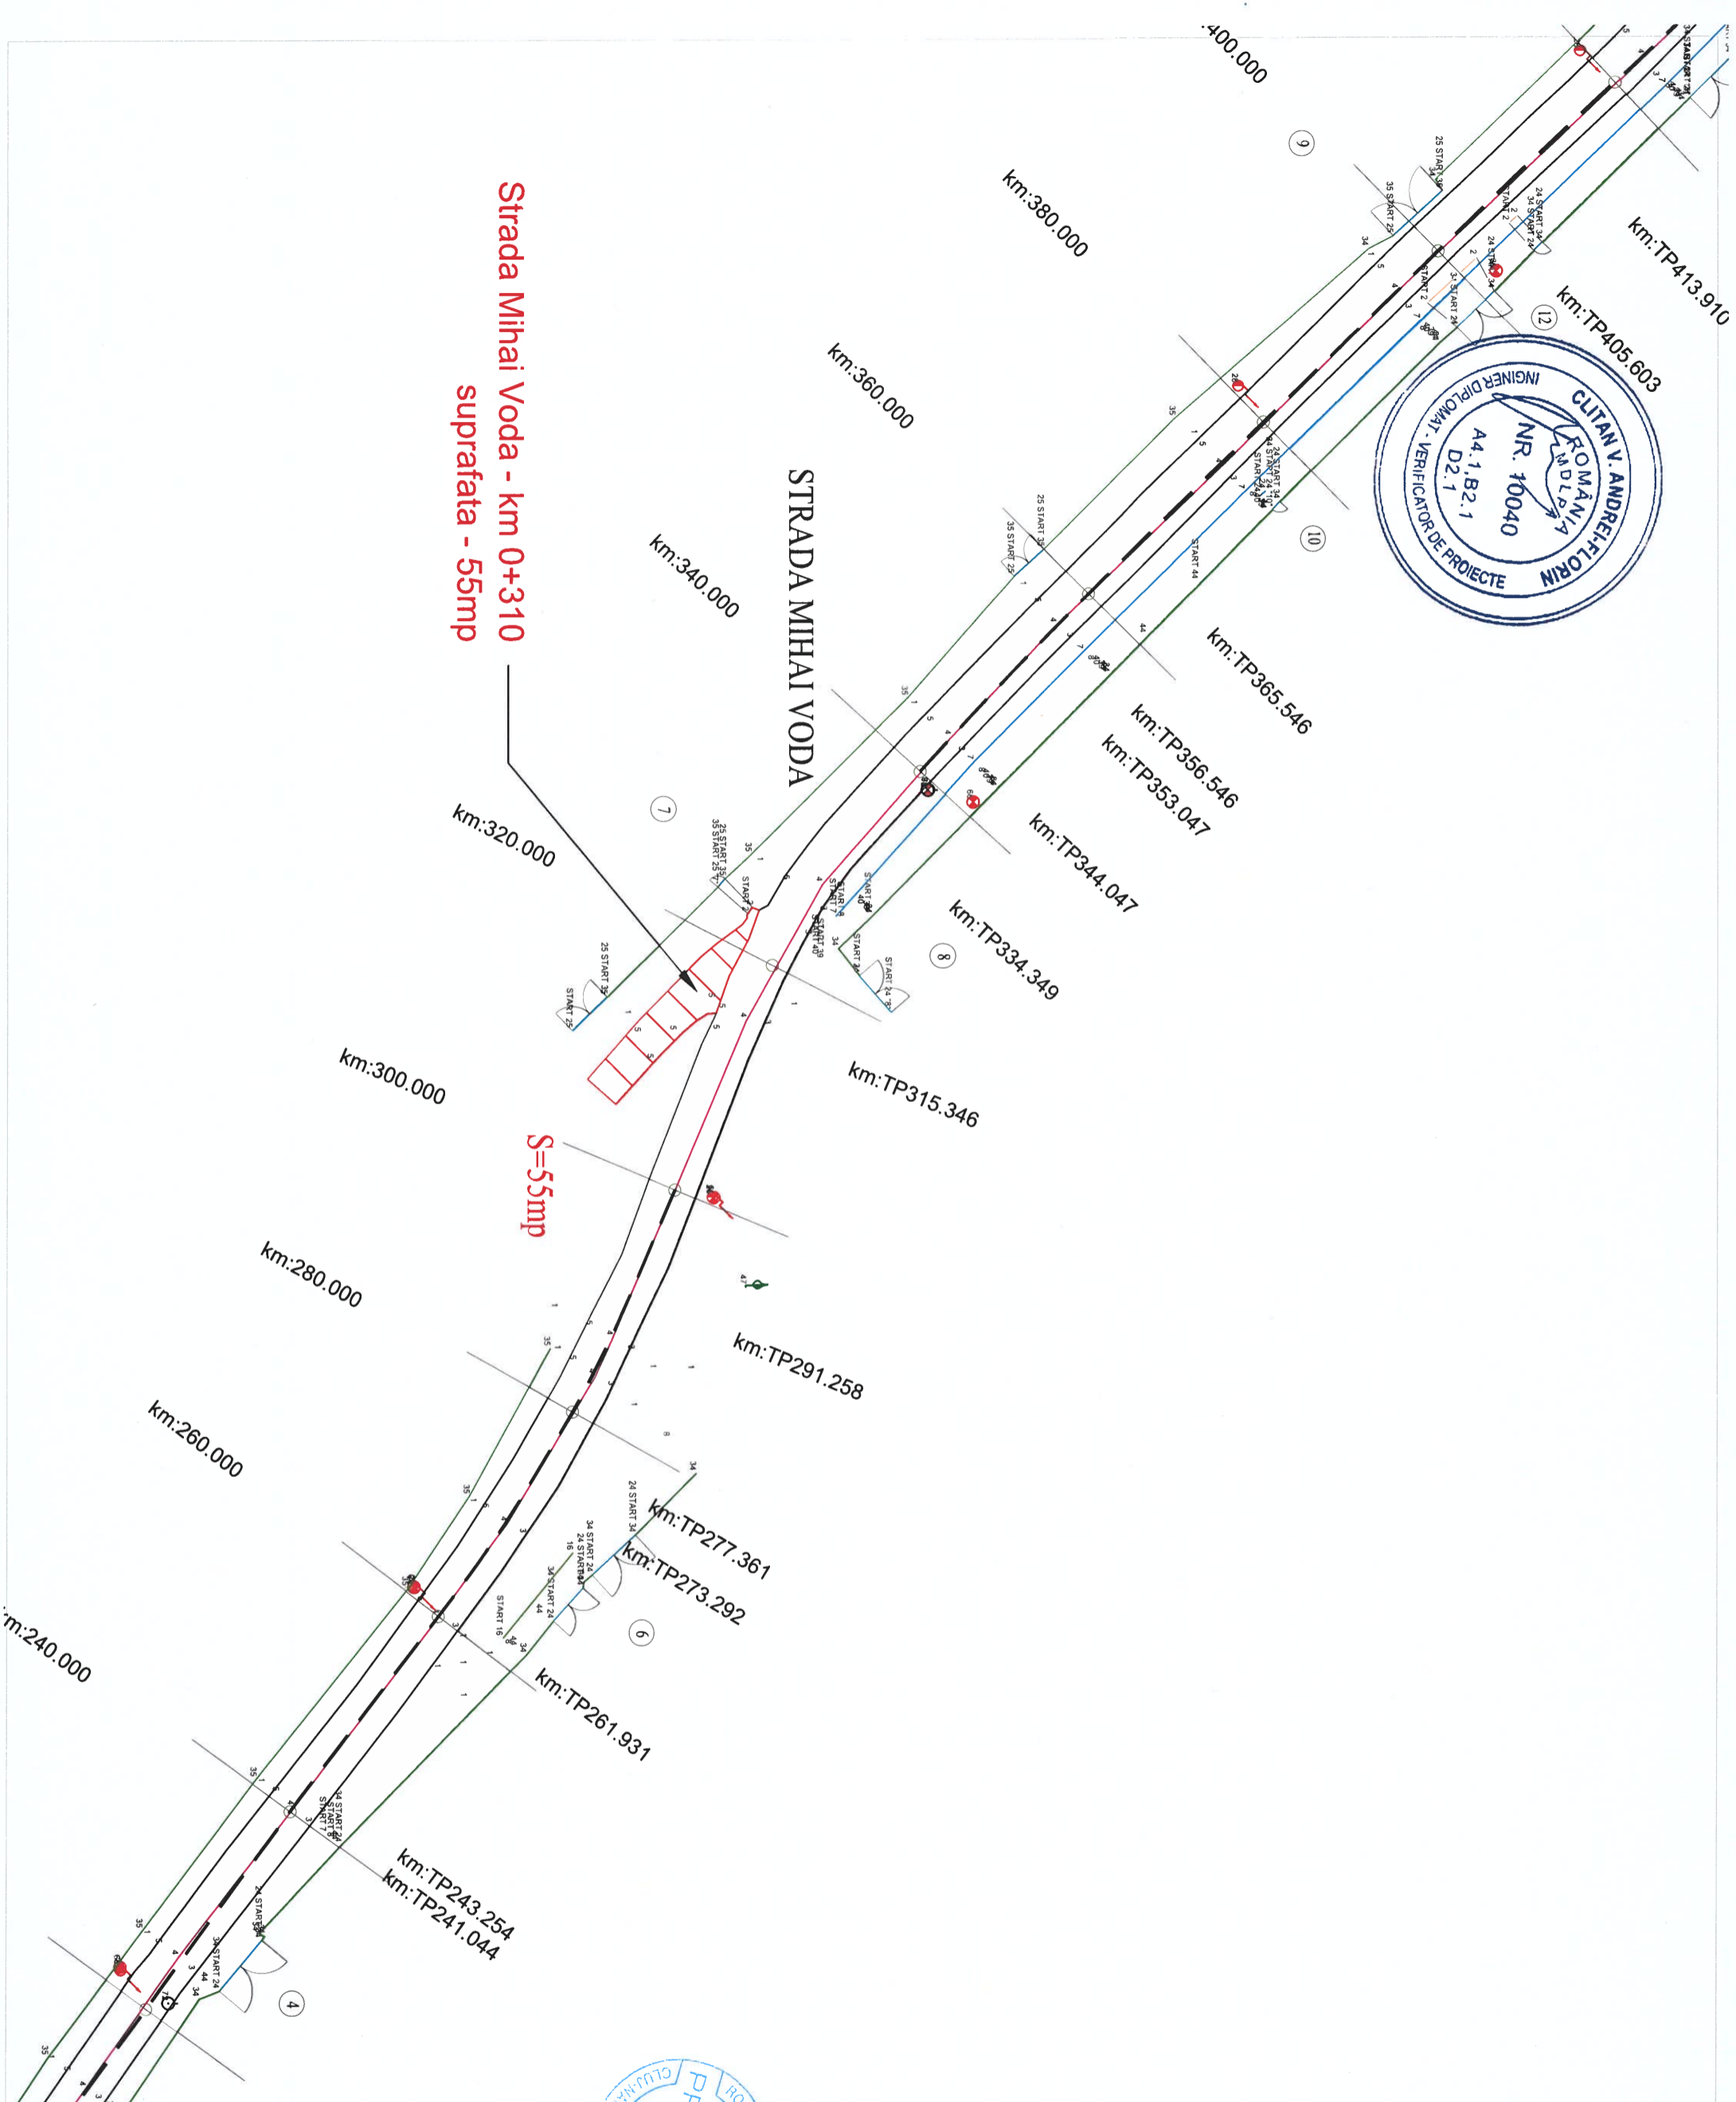

**Strada Mihai Voda - km 0+310
suprafata - 55mp**

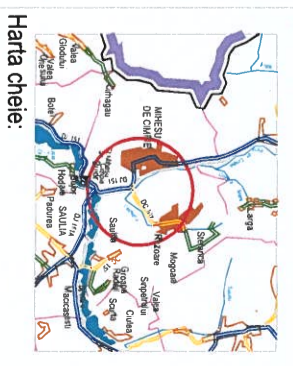

Harta cheie:


BENEFICIAR
Mihăești de Câmpie

DENUMIREA CONTRACTULUI
Asistența tehnică
pentru realizarea obiectivului de investiții:
"Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Sat Răzoare, comuna Mihăești de Câmpie
jud. Mureș"

Contract nr.:
5953/18.09.2023

DENUMIREA PROIECTULUI
"Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Sat Răzoare, comuna Mihăești de Câmpie
jud. Mureș"

Proiect nr.:
AT/2024



Proiectant general:
S.C. MVS PROCONS S.R.L.

Proiectat **Self proiect**
Ing. Oana Podar
Desenat **Manager proiect**
Ing. Oana Podar
VERIFICATOR TEHNIC **Data**

str. Mihai Voda

PLAN DE SITUATIE

Scara: 1:500

Faza: Asistența tehnică
Cod: AT/2024-SR-01- PS-06
